

LAPORAN MENEJEMEN TUGAS PROYEK(MTP)
PEMBUATAN SISTEM INFORMASI
BERBASIS WEB GIGAS STUDIO
JETIS PENDOWOREJO, GIRIMULYO, YOGYAKARTA




DISUSUN OLEH :

Yusuf Kurniawan	(1400018178)
Bayu Setyawan	(1500018253)
Lilik Tri Septiadi	(1500018275)
Zaeni Zen Akhmad	(1500018316)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA
2019

HALAMAN PENGESAHAN
MENEJEMEN TUGAS PROYÉK
PEMBUATAN WEB PROFILE GIGAS STUDIO

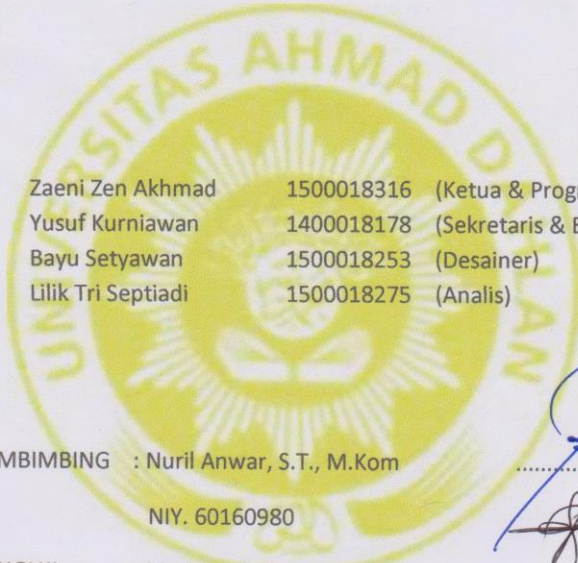

Zaeni Zen Akhmad	1500018316	(Ketua & Programmer)
Yusuf Kurniawan	1400018178	(Sekretaris & Bendahara)
Bayu Setyawan	1500018253	(Desainer)
Lilik Tri Septiadi	1500018275	(Analis)

PEMBIMBING : Nuril Anwar, S.T., M.Kom
NIY. 60160980

[Signature]
24/2 - 20

PENGUJI : Murinto, S.Si.m M.Kom
NIY. 60040496

[Signature]
26/2/2020

Yogyakarta, 29 - 07 - 2020

Kaprodi Teknik Informatika

[Signature]
29/2020

Nur Rochmah Dyah PA, S.T., M.Kom

NIP. 197608192005012001

Direktur Instansi

[Signature]

Purwanto

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Personel yang Terlibat	1
1.3 Proses Mendapatkan Proyek	2
1.4 Gambaran Proyek	3
1.5 Rencana Biaya	3
BAB 2 GAMBARAN INSTANSI	4
2.1 Sejarah Umum	4
2.2 Struktur Organisasi	5
2.3 Sumber Daya Manusia Dan Sumber Daya Fisik Lainnya	6
BAB 3 RENCANA MTP	7
3.1 Rencana Pembagian Tugas	7
3.2 Rancangan Sistem	8
3.3 Rencana Biaya	23
3.4 Rencana Jadwal Pengerjaan Proyek	27
BAB 4 PELAKSANAAN MTP	28
4.1 Realisasi Pembagian Tugas	28
4.2 Realisasi Jadwal Pelaksanaan	31
BAB 5 PENUTUP	32
5.1 Kesimpulan	32
5.2 Saran	32
LAMPIRAN.	33
Source code	33
Dokumentasi.....	43
Riwayat Transaksi	47
MOU.....	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi	5
Gambar 3.1 Rancangan Usecase Diagram	10
Gambar 3.2 Activity Diagram Login Admin	11
Gambar 3.3 Aktivitas Admin Logout	12
Gambar 3.4 Aktivitas Melihat Jasa	13
Gambar 3.5 Aktivitas Admin Menambah Jasa	14
Gambar 3.6 Aktivitas Admin Mengedit Data	15
Gambar 3.7 Aktivitas Admin Menghapus Data	16
Gambar 3.8 Halaman Login Admin	17
Gambar 3.9 Halaman Dashboard	17
Gambar 3.10 Halaman Kategori	18
Gambar 3.11 Halaman Galeri	18
Gambar 3.12 Halaman About us	19
Gambar 3.13 Halaman Utama Website	19
Gambar 3.14 Halaman About Us	20
Gambar 3.15 Halaman Galeri/Works	21
Gambar 3.16 Halaman Contact	22

DAFTAR TABEL

TABEL	HALAMAN
Tabel 1.1 Rencana Biaya	3
Tabel 3.1 Gambaran Keuangan Secara Umum	23
Tabel 3.2 Honorium Pelaksanaan	23
Tabel 3.3 Konsumsi dan Transportasi	24
Tabel 3.4 Kesekretariatan	24
Tabel 3.5 Anggaran Biaya Secara Umum	25
Tabel 3.6 Secara Rincian Keseluruhan	25
Tabel 3.7 Rencana Jadwal Pengerjaan Proyek.....	27
Tabel 4.1 Pembagian Tugas Ketua	28
Tabel 4.2 Pembagian Tugas Sekretaris	28
Tabel 4.3 Pembagian Tugas Bendahara	29
Tabel 4.4 Pembagian Tugas Programmer	29
Tabel 4.5 Pembagian Tugas Analis.....	30
Tabel 4.6 Pembagian Tugas Desainer	30
Tabel 4.7 Realisasi Jadwal Pelaksanaan	31
